

足立事業所リニューアル通信

Vol.43



東京団地倉庫
足立事業所

2026年2月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
※番号は計画一覧より

エレベーター準撤去更新工事10期工事がまもなく完了します。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。
・「エレベーター準撤去更新工事」10期工事対象の3A号機及び9B号機が当初よりも早い3月12日にテナント様へお引き渡し予定となります。
また、11期工事対象の2A号機及び7B号機を3月21日から開始いたします。土日のELV資材搬出入の際のスペース確保等のご協力をお願いいたします。

エレベーター準撤去更新工事状況
(かごドア据付)




エレベーター準撤去更新工事状況
(撤去品搬出)



エレベーター準撤去更新工事状況
(かごドア配線)



2026年2月20日～2026年3月23日までの工事予定

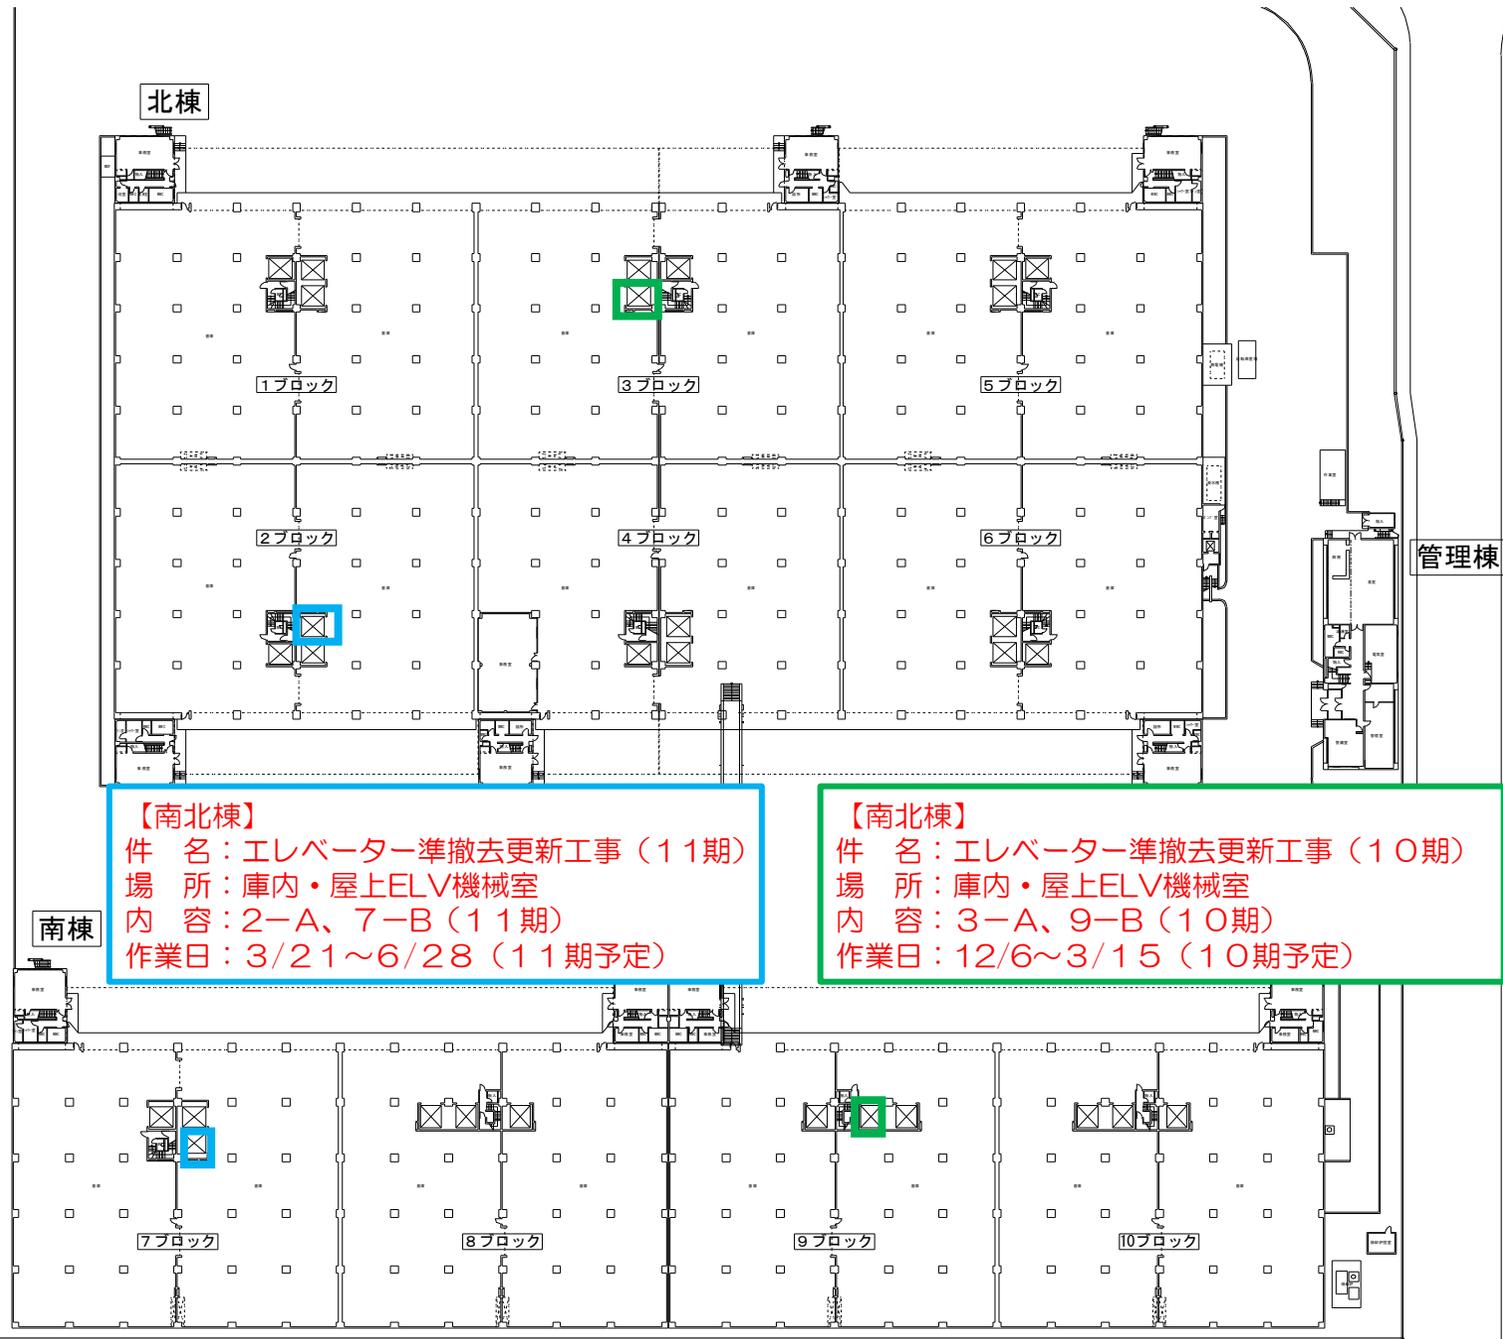

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了 ・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。
