

足立事業所リニューアル通信

Vol.47



東京団地倉庫
足立事業所

2026年6月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
 - ③庫内床壁補修工事
 - ⑩イートイン改修（テラス化）工事
- ※番号は計画一覧より

イートイン改修（テラス化）工事が順調に推移しています。


足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「イートイン改修（テラス化）工事」各階のトイレ内の美装化が完了致しました。現在はシャワーブース設置・管理棟内外の塗装を施工しております。
- ・「庫内床壁補修工事」5月23日より施工開始しており、6月末に完工予定となります。6月27日からは庫内壁サイン工事を実施いたします。こちらも日程の詳細決まり次第改めて連絡いたします。
- ・「エレベーター準撤去更新工事」11期工事対象の2A号機及び7B号機について、6月末完了に向けて順調に工事進捗しております。7月4日からは5C号機、7A号機が対象の12期工事が始まります。引き続き、工事ご協力お願いいたします。

管理棟トイレ更新状況




管理棟1階シャワーブース工事状況

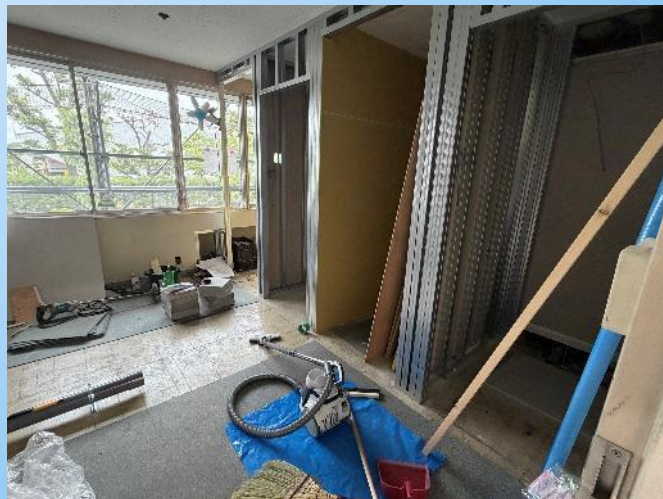

庫内床補修状況



2026年6月20日～2026年7月17日までの工事予定

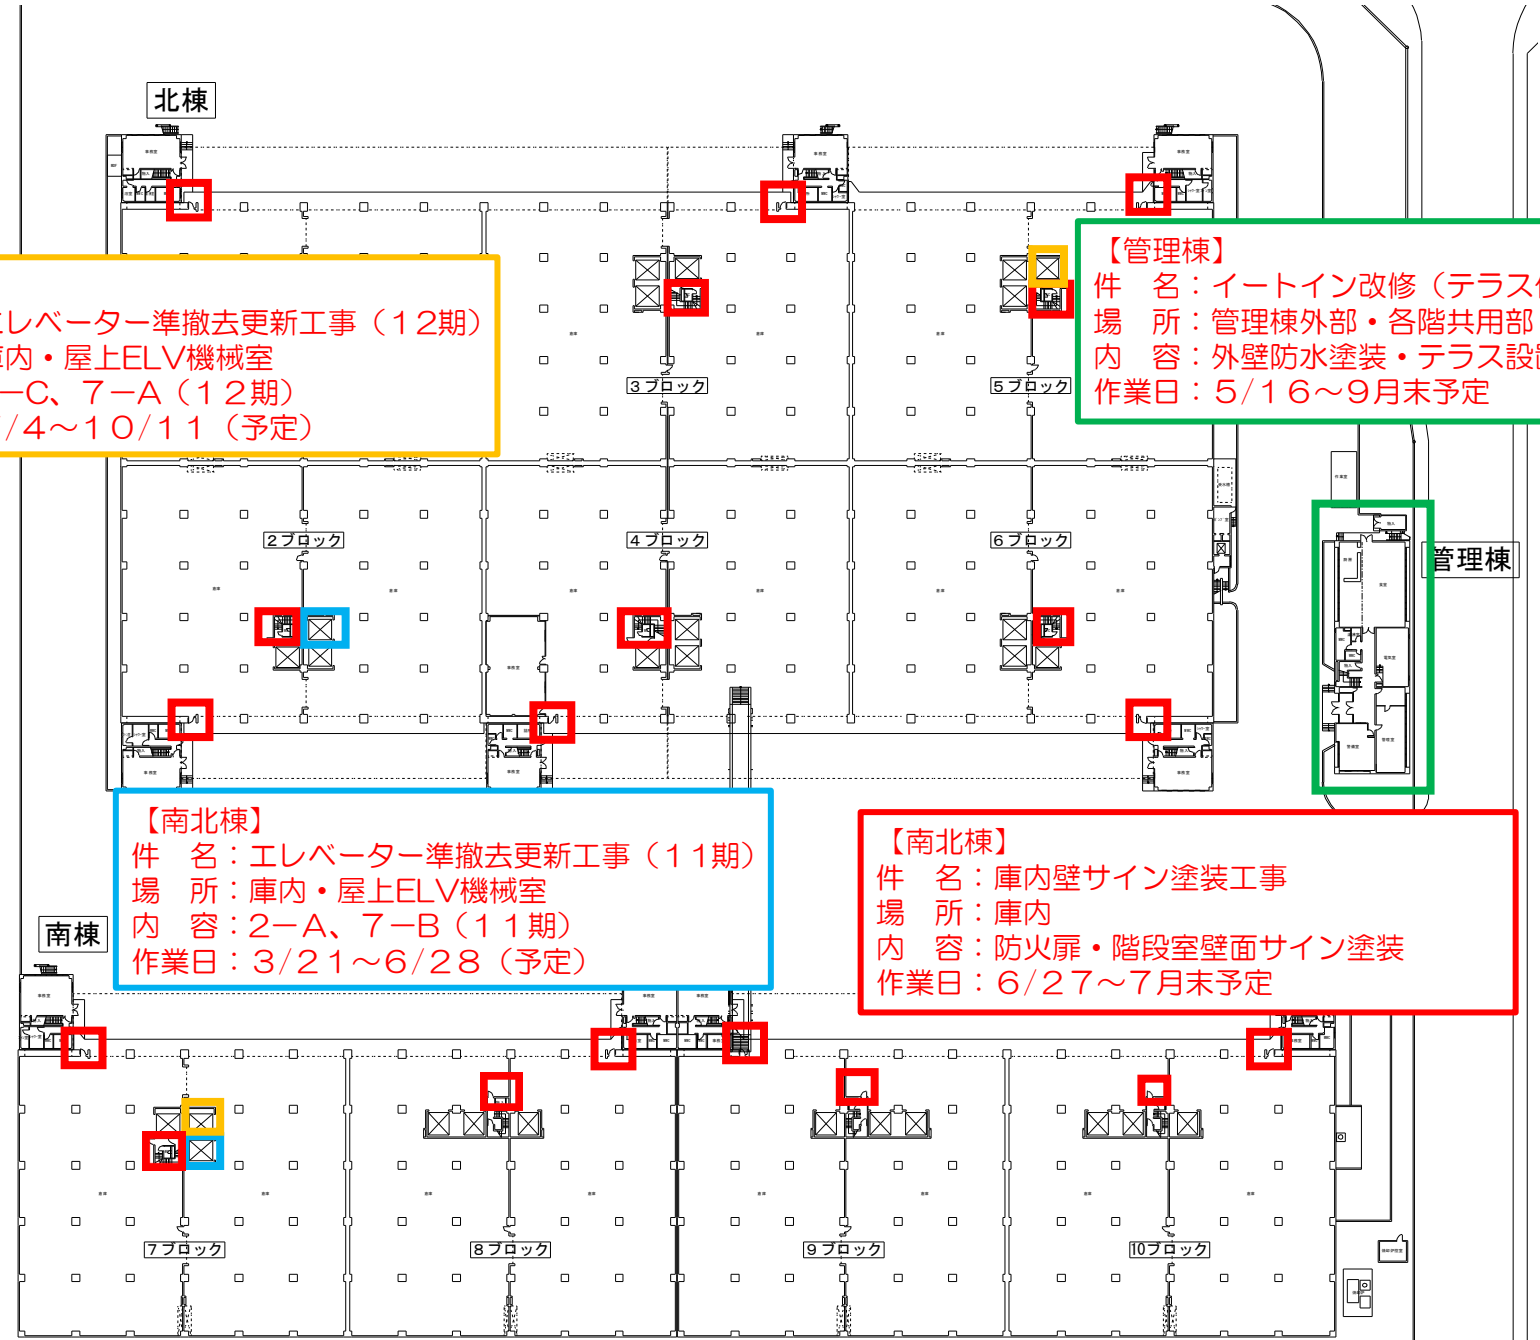

【南北棟】
件名：エレベーター準撤去更新工事（12期）
場所：庫内・屋上ELV機械室
内容：5-C、7-A（12期）
作業日：7/4～10/11（予定）

【管理棟】
件名：イートイン改修（テラス化）工事
場所：管理棟外部・各階共用部
内容：外壁防水塗装・テラス設置他
作業日：5/16～9月末予定

【南北棟】
件名：エレベーター準撤去更新工事（11期）
場所：庫内・屋上ELV機械室
内容：2-A、7-B（11期）
作業日：3/21～6/28（予定）

【南北棟】
件名：庫内壁サイン塗装工事
場所：庫内
内容：防火扉・階段室壁面サイン塗装
作業日：6/27～7月末予定

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了 ・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。
