

足立事業所リニューアル通信

Vol.22

HAPPY VALENTINE'S DAY



東京団地倉庫
足立事業所

2024年2月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ②外壁防水塗装工事
- ⑫消防設備更新工事(附属事務棟)
- ⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

消防設備更新工事が完了致しました！！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」>乗りかご組立作業が完了し、試運転調整実施中です。3月10日までに完了させ、翌日テナント様にお引渡し予定です。
- ・「外壁防水塗装工事」>現在足場解体作業を3月上旬を目途に進めております。同時に倉庫バス周りの塗装を進めております。
- ・「消防設備更新工事(附属事務棟・管理棟)」>2月4日(日)の作業をもって附属事務棟及び管理棟の施工を完了致しました。荷物のご移動等、ご協力ありがとうございました。
- ・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>2月4日(日)に資機材を屋上へ揚重を行い、2月8日より屋上にてケーブルラックの敷設作業を行っております。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

北棟東面外壁社章サイン




北棟倉庫バス周り塗装



受変電設備更新工事揚重作業



2024年2月17日～2024年3月15日までの工事予定

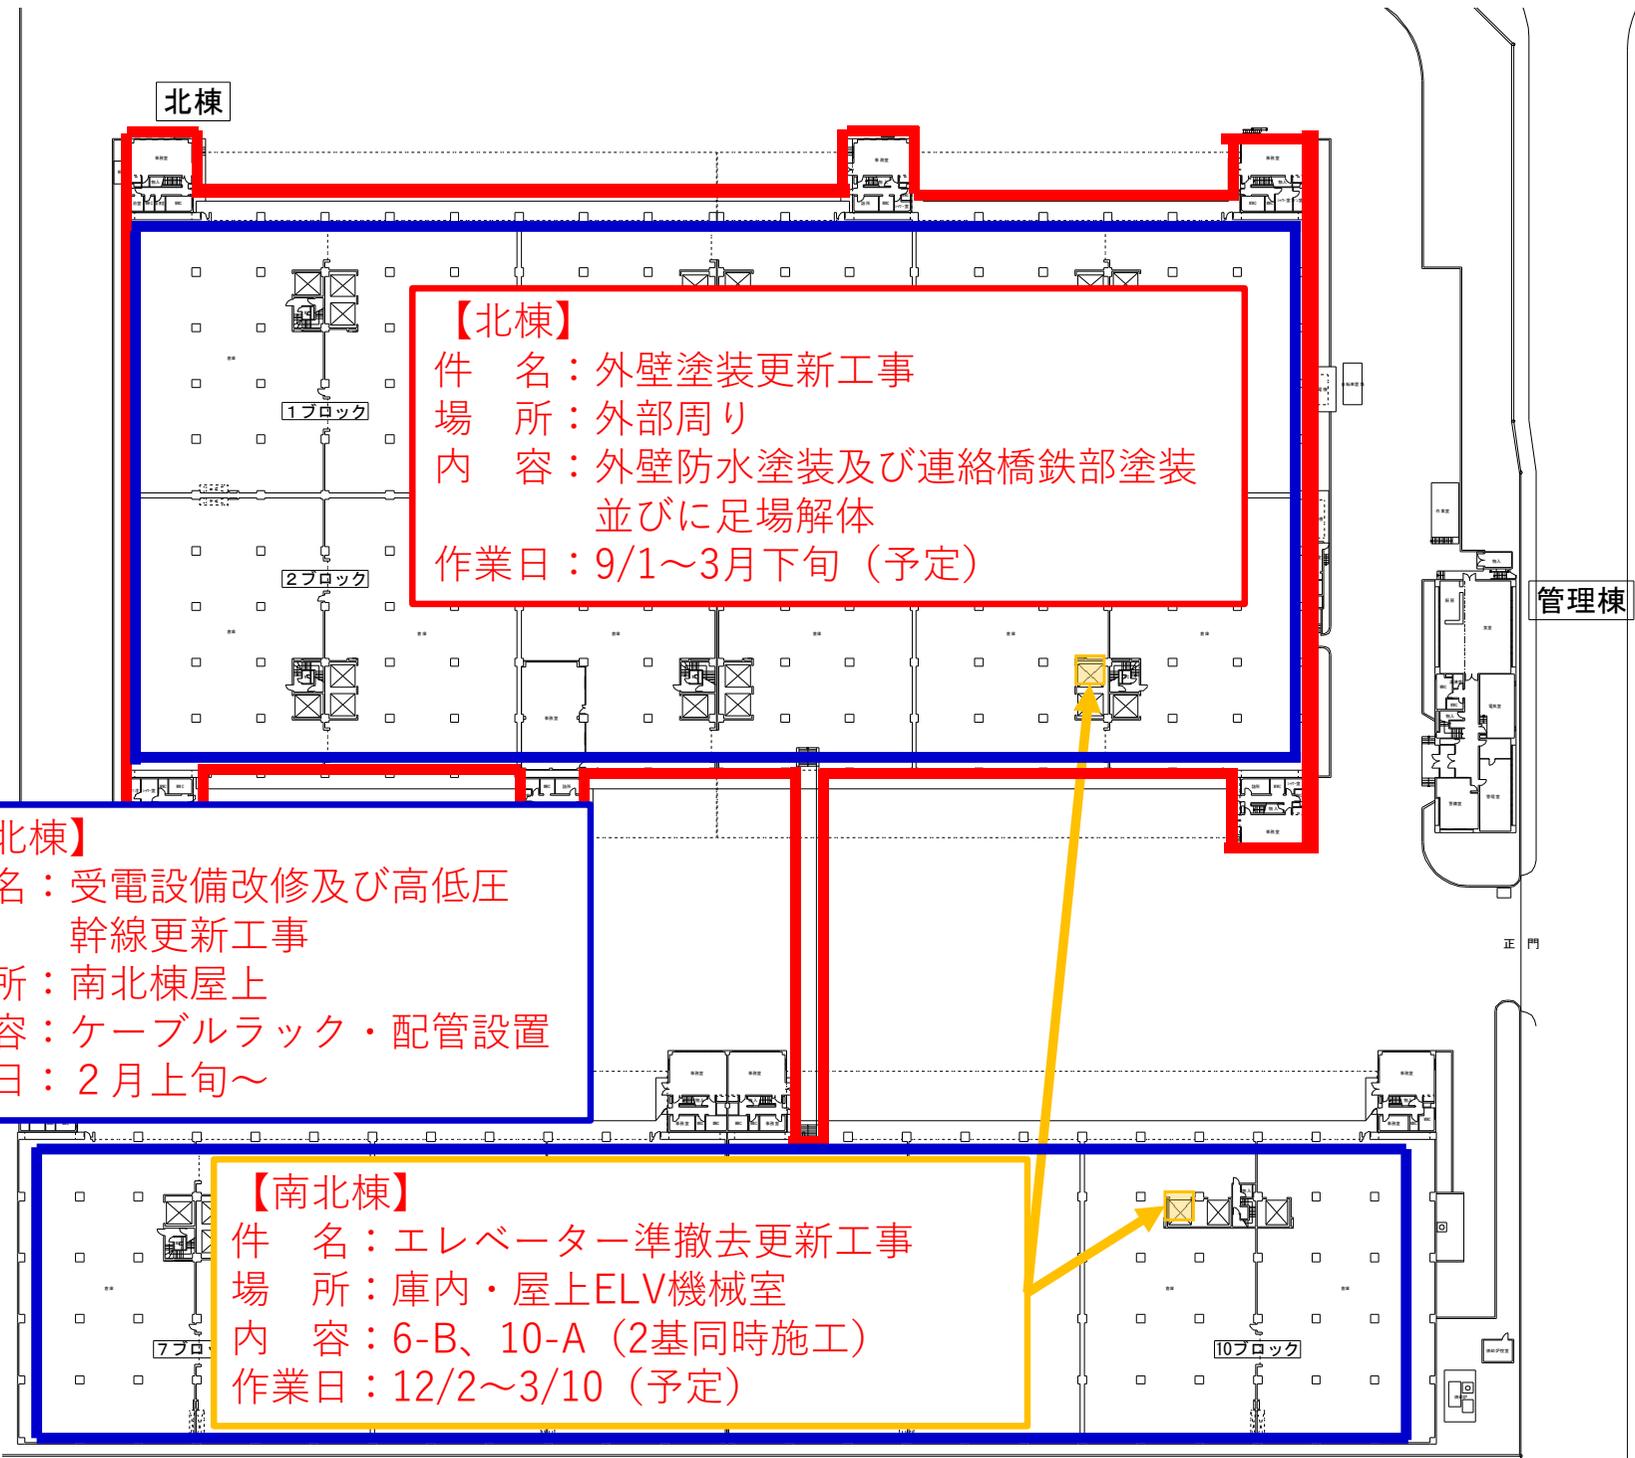

【北棟】
件名：外壁塗装更新工事
場所：外部周り
内容：外壁防水塗装及び連絡橋鉄部塗装
並びに足場解体
作業日：9/1～3月下旬（予定）

【南北棟】
件名：受電設備改修及び高低圧
幹線更新工事
場所：南北棟屋上
内容：ケーブルラック・配管設置
作業日：2月上旬～

【南北棟】
件名：エレベーター準撤去更新工事
場所：庫内・屋上ELV機械室
内容：6-B、10-A（2基同時施工）
作業日：12/2～3/10（予定）
