

足立事業所リニューアル通信 Vol.44



東京団地倉庫
足立事業所

2026年3月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
※番号は計画一覧より

エレベーター準撤去更新工事10期工事が完了し、11期工事を開始します。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。
・「エレベーター準撤去更新工事」10期工事対象の3A号機及び9B号機が当初計画より早い3月12日にテナント様へお引き渡し予定となります。
また、11期工事対象の2A号機及び7B号機を3月21日から開始いたします。土日のELV資材搬出入の際のスペース確保等のご協力をお願いいたします。

エレベーター準撤去更新工事状況
10期工事 意匠ステッカー貼付け




エレベーター準撤去更新工事状況
10期工事 労働基準監督署検査



エレベーター準撤去更新工事状況
11期工事 昇降路内間仕切設置



2026年3月23日～2026年4月17日までの工事予定

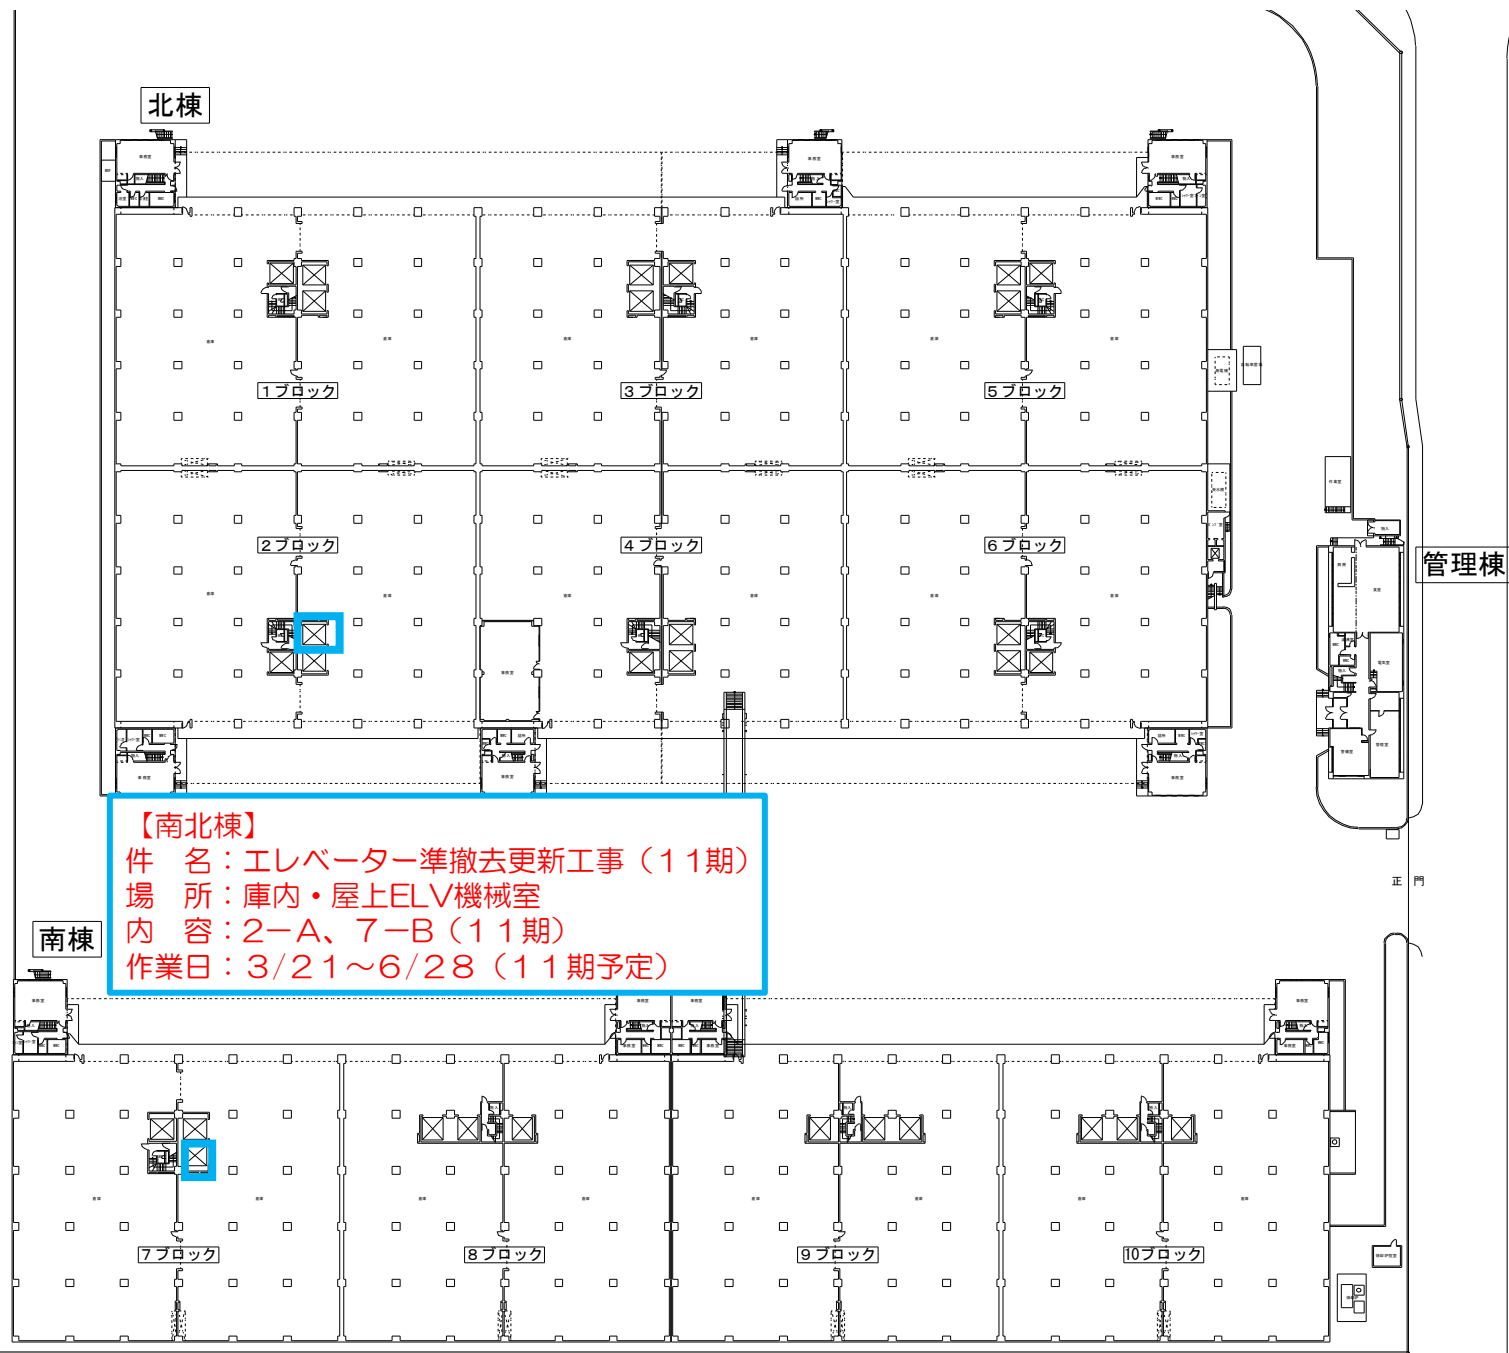

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

| | ELV号機 | 期間 | | ELV号機 | 期間 |
|----|-----------|----------------------------|-----|----------|----------------------------|
| 1期 | 1A 3B | 2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日 | 9期 | 1C 3C | 2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日 |
| 2期 | 8C 10B | 2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日 | 10期 | 3A 9B | 2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日 |
| 3期 | 6B 10A | 2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日 | 11期 | 2A 7B | 2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日 |
| 4期 | 8B 9C | 2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日 | 12期 | 5C 7A | 2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日 |
| 5期 | 4C 9A | 2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日 | 13期 | 2B 6C | 2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日 |
| 6期 | 4A 10C | 2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日 | 14期 | 2C 5B | 2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日 |
| 7期 | 4B 6A | 2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日 | 15期 | 5A 7C | 2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日 |
| 8期 | 1B 8A | 2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日 | | | ・・・施工完了 ・・・施工中 |

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。
