

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.7



東京団地倉庫  
足立事業所

2022年11月発行



1

### ☆今月のトピックス☆

#### ②外壁防水塗装工事

→南棟足場架け作業完了

→既存外壁調査及び補修

→外部鉄部シーリング打替え及び塗装

#### ⑫消防設備更新工事

→施工進捗状況

※番号は計画一覧より

### 倉庫内での作業も開始し、引き続き安全第一に進めてまいります！！

東京団地倉庫(株)足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

外壁防水塗装更新工事に伴う足場架け作業は、皆様のご協力もあり予定通り10月31日をもって南棟全面に足場・養生シートが設置されました。現在は設置した足場を利用して既存外壁の調査、補修・鉄部周りのシーリング材の打替え及び塗装を実施しております。足場材の揚重に際し、ご協力誠にありがとうございました。

消防設備更新工事ですが、11月12日(土)以降、北棟より着工しております。屋内・屋外消火栓に設置されている表示灯・地区ベル・発信機及び倉庫1階に設置されている単独地区ベルを更新致します。施工状況は別紙をご参照ください。

土日祝日での作業となりますが、1日の施工が完了した際に、全館放送にて試験鳴動実施アナウンスを行ったのち全館ベル鳴動を実施しております。ご理解の程、よろしくお願い致します。ご不明点ございましたら管理室までご相談ください。

更新前



### 屋内・屋外消火栓設備

#### 表示灯

視認性が向上


#### 地区ベル

音量が大きくなり  
起動確認性向上

#### 発信機

押しボタンのパネル破損軽減

更新後

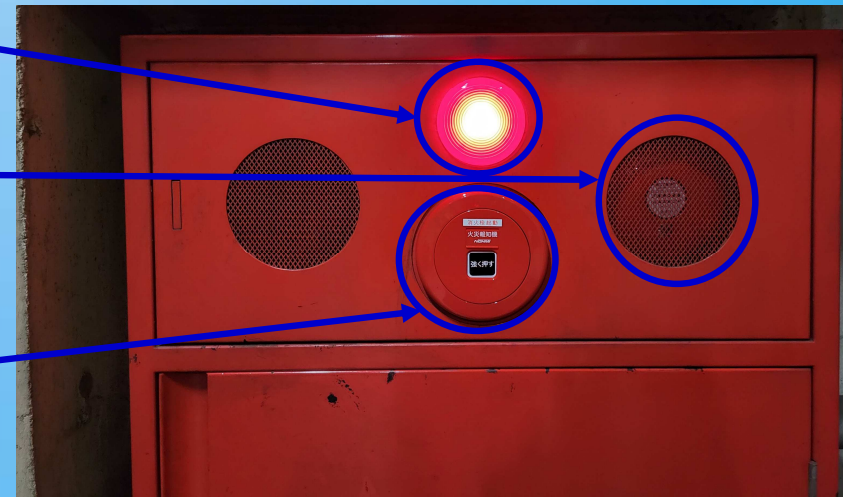

# 11月18日～12月18日までの工事予定

