



☆今月のピックアップ☆

- ②外壁防水塗装工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑫消防設備更新工事
- ⑬電話・LAN回線用縦配管ルート構築工事
- ⑮消火・給水保温ラッキング更新工事

※番号は計画一覧より

今期中に1件の工事が完了予定となります！！

東京団地倉庫(株)足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「外壁防水塗装工事」南棟倉庫棟の仕上げ塗装の施工が完了致しました。足場の解体を順次進めて参ります。また南棟東面に内照式社章サインを設置致しました。
 - ・「照明器具LED化工事」及び「消防設備更新工事」現在1・2フロックにて施工を進めております。引き続き荷物移動のない箇所を進めていき、荷物移動の必要な箇所については調整を図りながら施工させていただきます。
 - ・「電話・LAN回線用縦配管ルート構築工事」コア抜き作業は概ね完了致しました。平日にてケーブルラックの設置作業を進めて参ります。
 - ・「消火・給水保温ラッキング更新工事」断水の伴う施工については2/18をもって完了致しました。今後は断水を伴わない保温・ラッキングの更新を進めて参ります。
- 各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。
また、消火・給水保温ラッキング更新工事については3月末で施工完了予定です。ご協力誠にありがとうございました。
ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

南棟内照式社章サイン試験点灯




保温・ラッキング更新 施工風景



庫内トイレ人感センサー設置状況



2023年3月18日～2023年4月21日までの工事予定

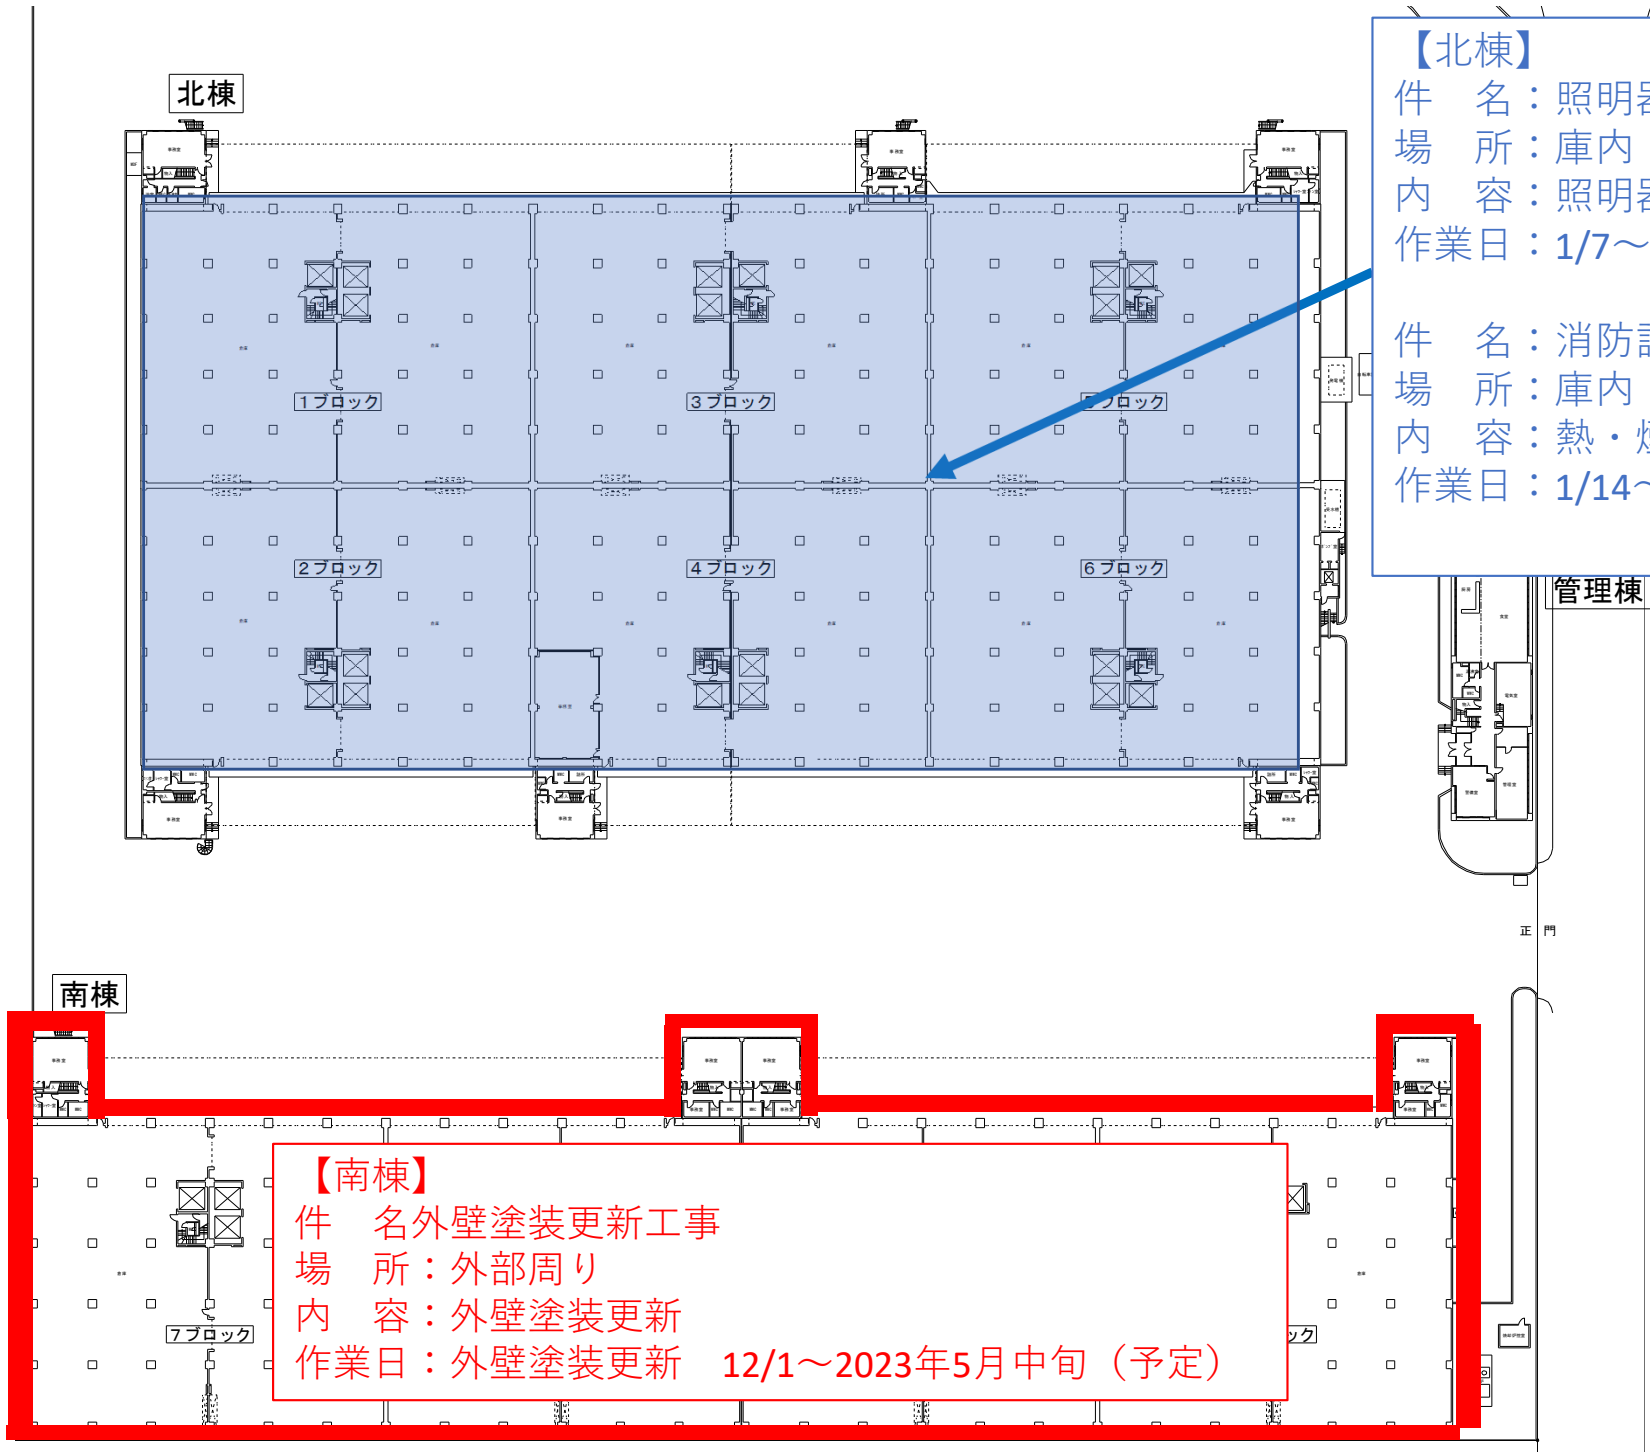

【北棟】

件名：照明器具LED化工事
場所：庫内
内容：照明器具LED化
作業日：1/7～(土日作業)

件名：消防設備更新工事
場所：庫内
内容：熱・煙感知器
作業日：1/14～(土日作業)

【南棟】

件名：外壁塗装更新工事
場所：外部周り
内容：外壁塗装更新
作業日：外壁塗装更新 12/1～2023年5月中旬(予定)
