

足立事業所リニューアル通信

Vol.50



東京団地倉庫
足立事業所

2026年9月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ③庫内床壁補修工事
- ⑩イートイン改修（テラス化）工事

※番号は計画一覧より

イートイン改修（テラス化）工事によりテラスが完成しました！

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「イートイン改修（テラス化）工事」 9月3日にすべての施工が完了いたしました。また、休憩室内に新たに無人コンビニを9月24日から設置予定としています。
- ・「庫内壁サイン塗装工事」 8月29日に庫内床補修の是正工事を実施し、工事完了致しました。
- ・「エレベーター準撤去更新工事」 12期工事対象の5C号機及び7A号機について、10月5日に労基検査、10月7日にテナント様へお引渡し予定です。引き続き、工事ご協力お願い致します。

管理棟横テラス完成状況




管理棟横喫煙所完成状況



管理棟横防災用井戸設置状況



2026年9月18日～2026年10月16日までの工事予定

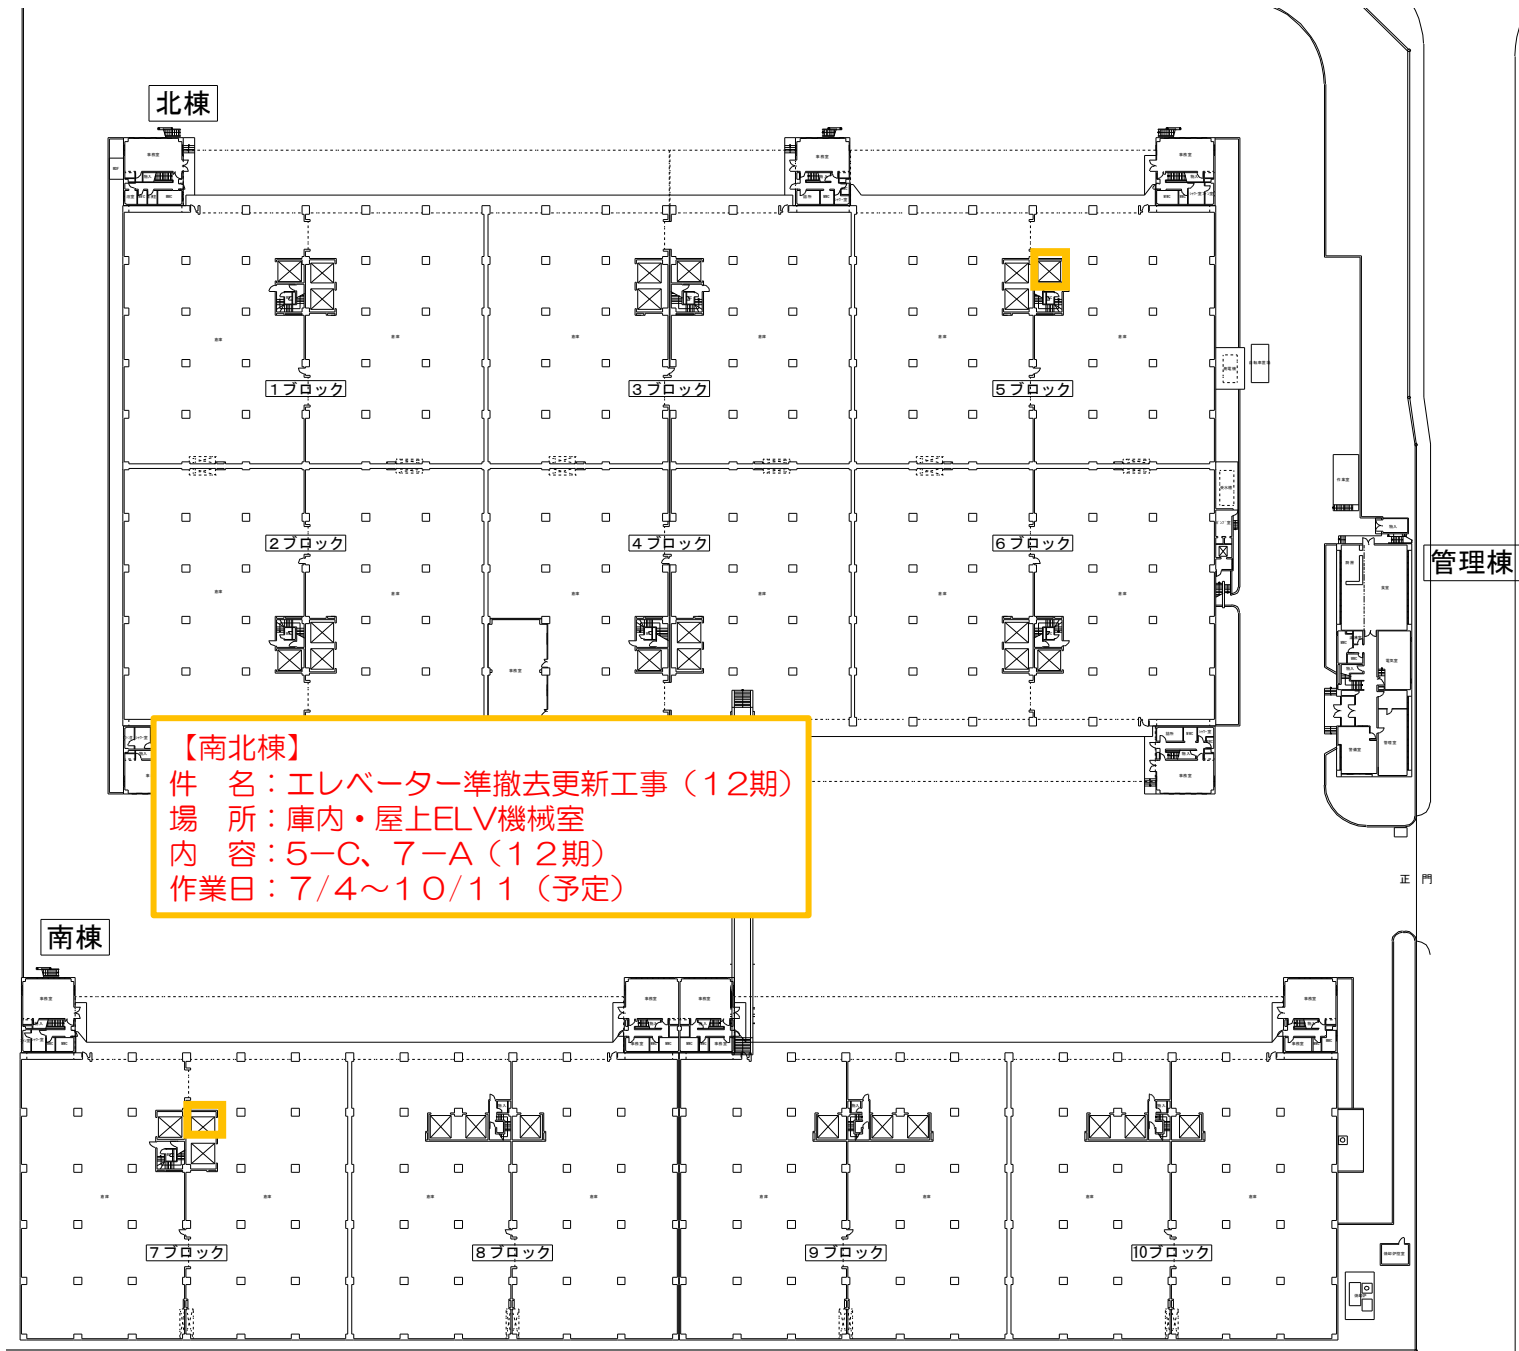

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内致します。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内致します。
