

足立事業所リニューアル通信

Vol.48



東京団地倉庫
足立事業所

2026年7月発行



☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ③庫内床壁補修工事
- ⑮イートイン改修（テラス化）工事

※番号は計画一覧より

イートイン改修（テラス化）工事により管理棟が様変わりしています。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「イートイン改修（テラス化）工事」休憩室内の照明更新・窓枠サッシの更新が完了致しました。現在は外壁塗装更新・床面の張り替えを施工しております。
- ・「庫内壁サイン塗装工事」6月27日より施工開始しており、7月中旬に完工予定となります。各テナント様施工当日にはご協力のほどよろしくお願いいたします。
- ・「エレベーター準撤去更新工事」5C号機、7A号機が対象の12期工事が始まりました。荷物移動等多々お願いする場面がございますが、引き続き工事へのご協力をお願いいたします。

管理棟休憩室照明更新状況




管理棟サッシ更新状況



庫内サイン施工状況



2026年7月18日～2026年8月21日までの工事予定

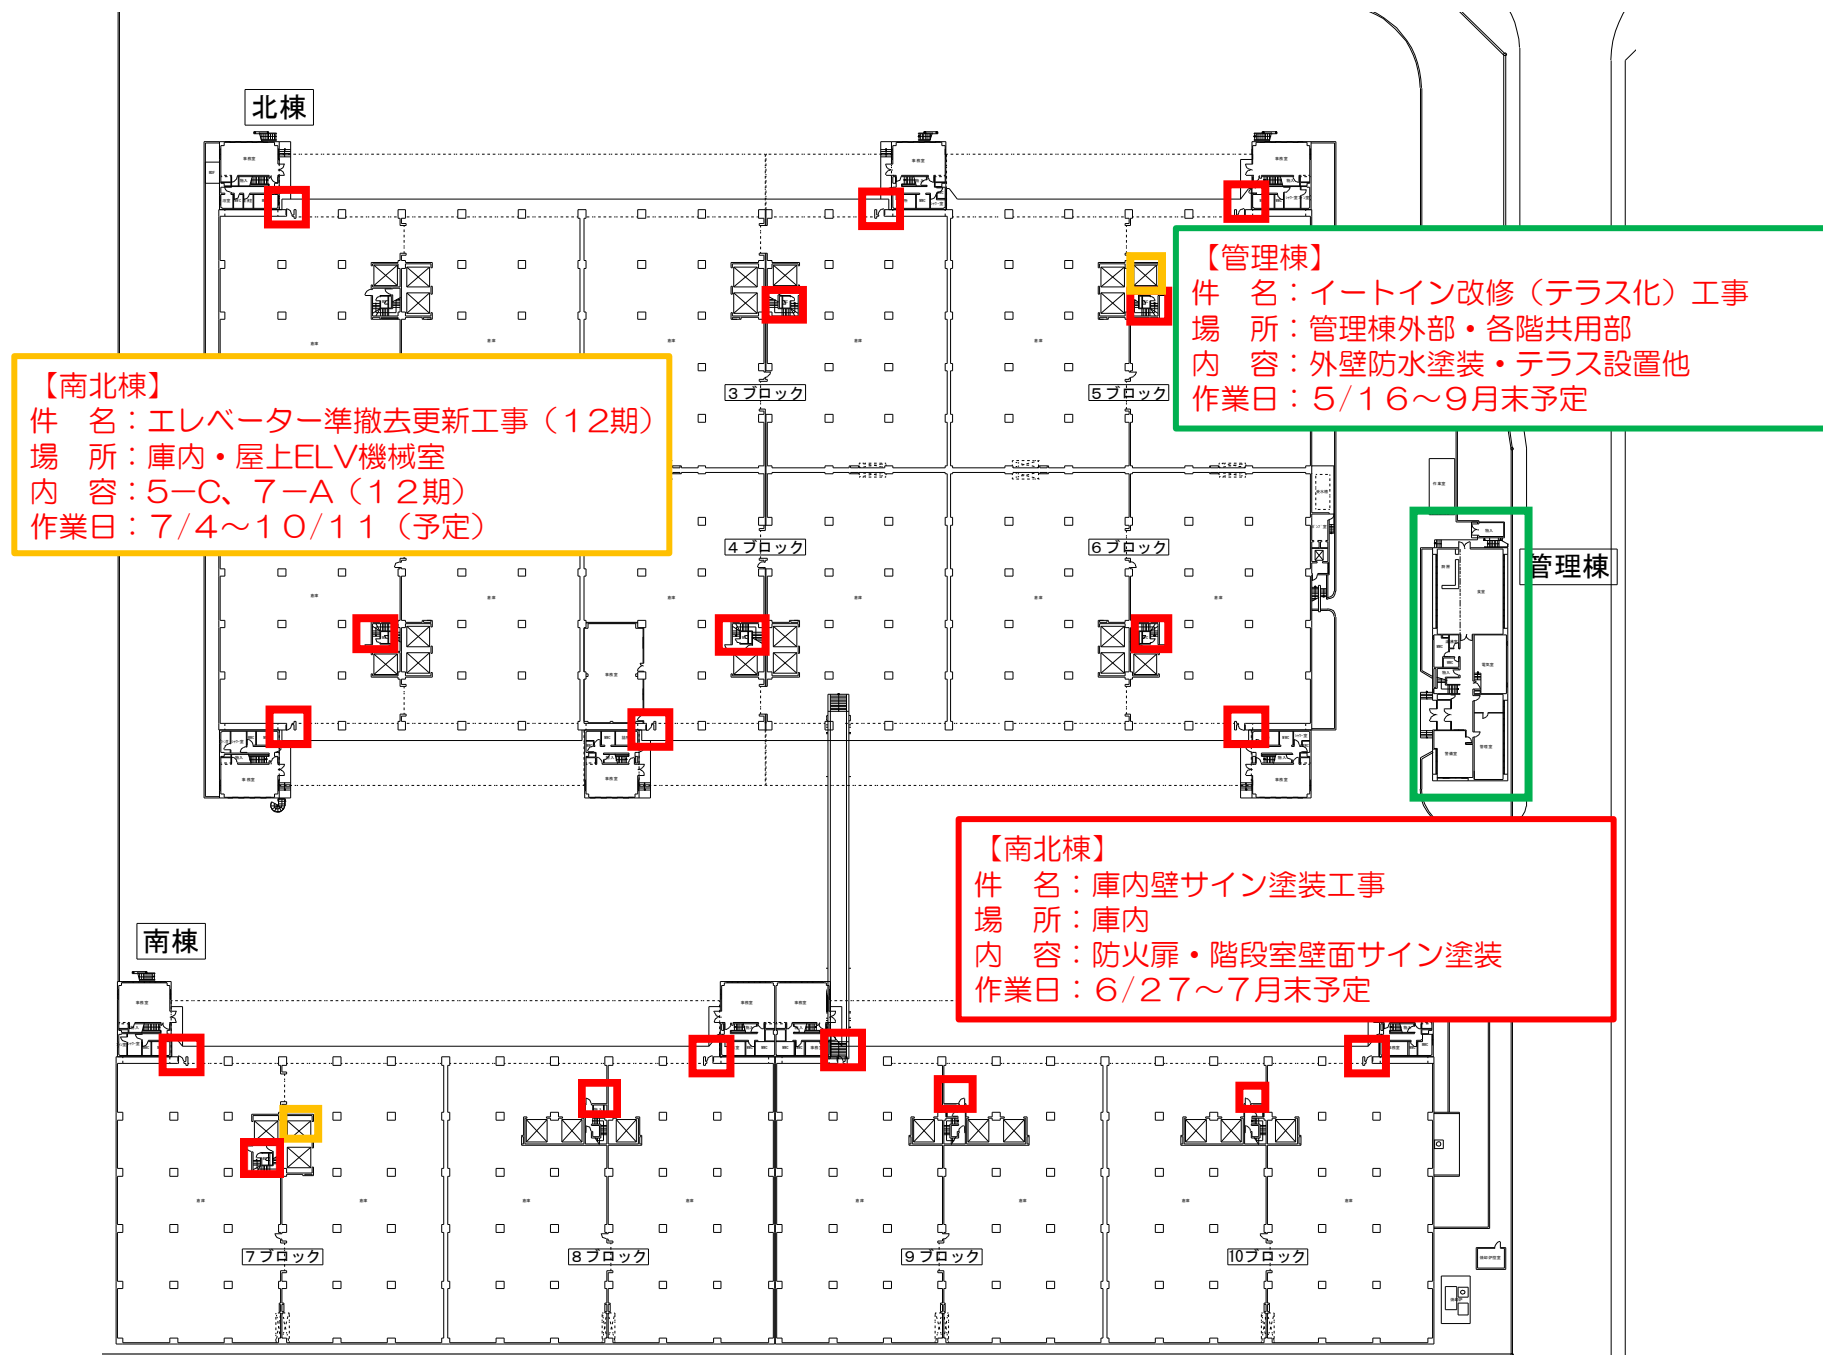

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。
